

百草园城市更新项目

工作周报

汇报单位：北京清尚
2026.6.22

目录




第一章 组织架构




第二章 上周工作



第三章 下周计划



第四章 工作计划



第五章 协调事宜

2026.06.22 ~ 2026.06.28

到岗管理人员名单

序号	职务	姓名	联系电话	是否到岗
1	项目经理	侯帅	13051103313	已到岗
2	项目技术负责人兼深化设计负责人	王健	13818589201	已到岗
3	计划经理	陈冲	13651007882	已到岗
4	生产经理（软装）	王亚广	15910813359	已到岗
5	生产经理（精装）	鲍永春	13382510829	已到岗
6	生产经理（机电）	袁永超	18900125480	已到岗
7	深化设计经理（软装）	李欢	17310298646	已到岗
8	深化设计（软装）	乔志广	13939996372	已到岗
9	深化设计（软装）	李水旺	18310163008	已到岗
10	深化设计（软装）	赵晨星	15011544879	已到岗
11	深化设计（软装）	龙方	13974050351	已到岗
12	深化设计经理（精装）	徐诗怡	18013705168	已到岗
13	深化设计（机电）	苏尧	13141422281	已到岗
14	成本经理（软装/精装）	郭建欣	15600173618	已到岗
15	商务经理（软装/精装）	薛智臣	18810013805	已到岗
16	预算员（软装/精装）	王迪	15726644536	已到岗
17	电气预算员	邓明伟	19937244723	已到岗
18	质量经理（软装）	周建忠	13636535828	已到岗
19	质量经理（精装）	李欣霖	17631518331	已到岗
20	安全经理（软装）	孙攀岳	18501166924	已到岗
21	安全经理（精装）	赵国显	18516217962	已到岗
22	资料员	蔡丽华	18600371133	已到岗
23	材料员（软装/精装）	肖自政	15093960151	已到岗



管理人员合影

2026.06.22 ~ 2026.06.28

项目重要节点

暂无节点数据

2026.06.22 ~ 2026.06.28

2.1 上周重要工作完成

序号	计划事项及完成情况	责任人
	员工餐厅区：	
1	食堂二层下周计划施工段划分完成0%	—
	高管办公区：	
2	高管办公区8F地暖盘管、吊顶龙骨及水电隐蔽工程施工完成约60%	—
3	北塔高管办公区8地暖铺装	—
4	高管层现场施工综合管理完成60%	刘二
	商业展示区：	
5	防高坠专项安全会及人员统计	—
6	各区域精装收尾完成55%	刘二
7	WW完成90%	刘二
8	WW完成55%	刘二

2026.06.22 ~ 2026.06.28

2.1 上周重要工作完成

序号	计划事项及完成情况	责任人
	员工餐厅区：	
1	食堂二层下周计划施工段划分完成0%	—
	高管办公区：	
2	高管办公区8F地暖盘管、吊顶龙骨及水电隐蔽工程施工完成约60%	—
3	北塔高管办公区8地暖铺装	—
4	高管层现场施工综合管理完成60%	刘二
	商业展示区：	
5	防高坠专项安全会及人员统计	—
6	各区域精装收尾完成55%	刘二
7	WW完成90%	刘二
8	WW完成55%	刘二

暂无图片

临时用电不规范

二、上周工作

2.12 现场工作：人员统计



防高坠专项安全会

序号	工种	本周人数	下周人数
1	5S小队	15	16
2	电工	5	5
3	电焊工	13	13
4	工长	8	8
5	库管	1	1
6	临电专员	1	1
7	木工	87	90
8	水工	35	35
9	瓦工	14	14
10	普工	22	22
11	油工	10	14
12	防水工	2	2
13	管理人员	23	23
14	室内电梯司机	2	2
15	合计	238	246

全部人员在场情况

上周人员统计表及防高坠安全教育现场照片

2026.06.22 ~ 2026.06.28


A4

 暂无图片

多功能厅巡检现场

2026.06.22 ~ 2026.06.28

A4

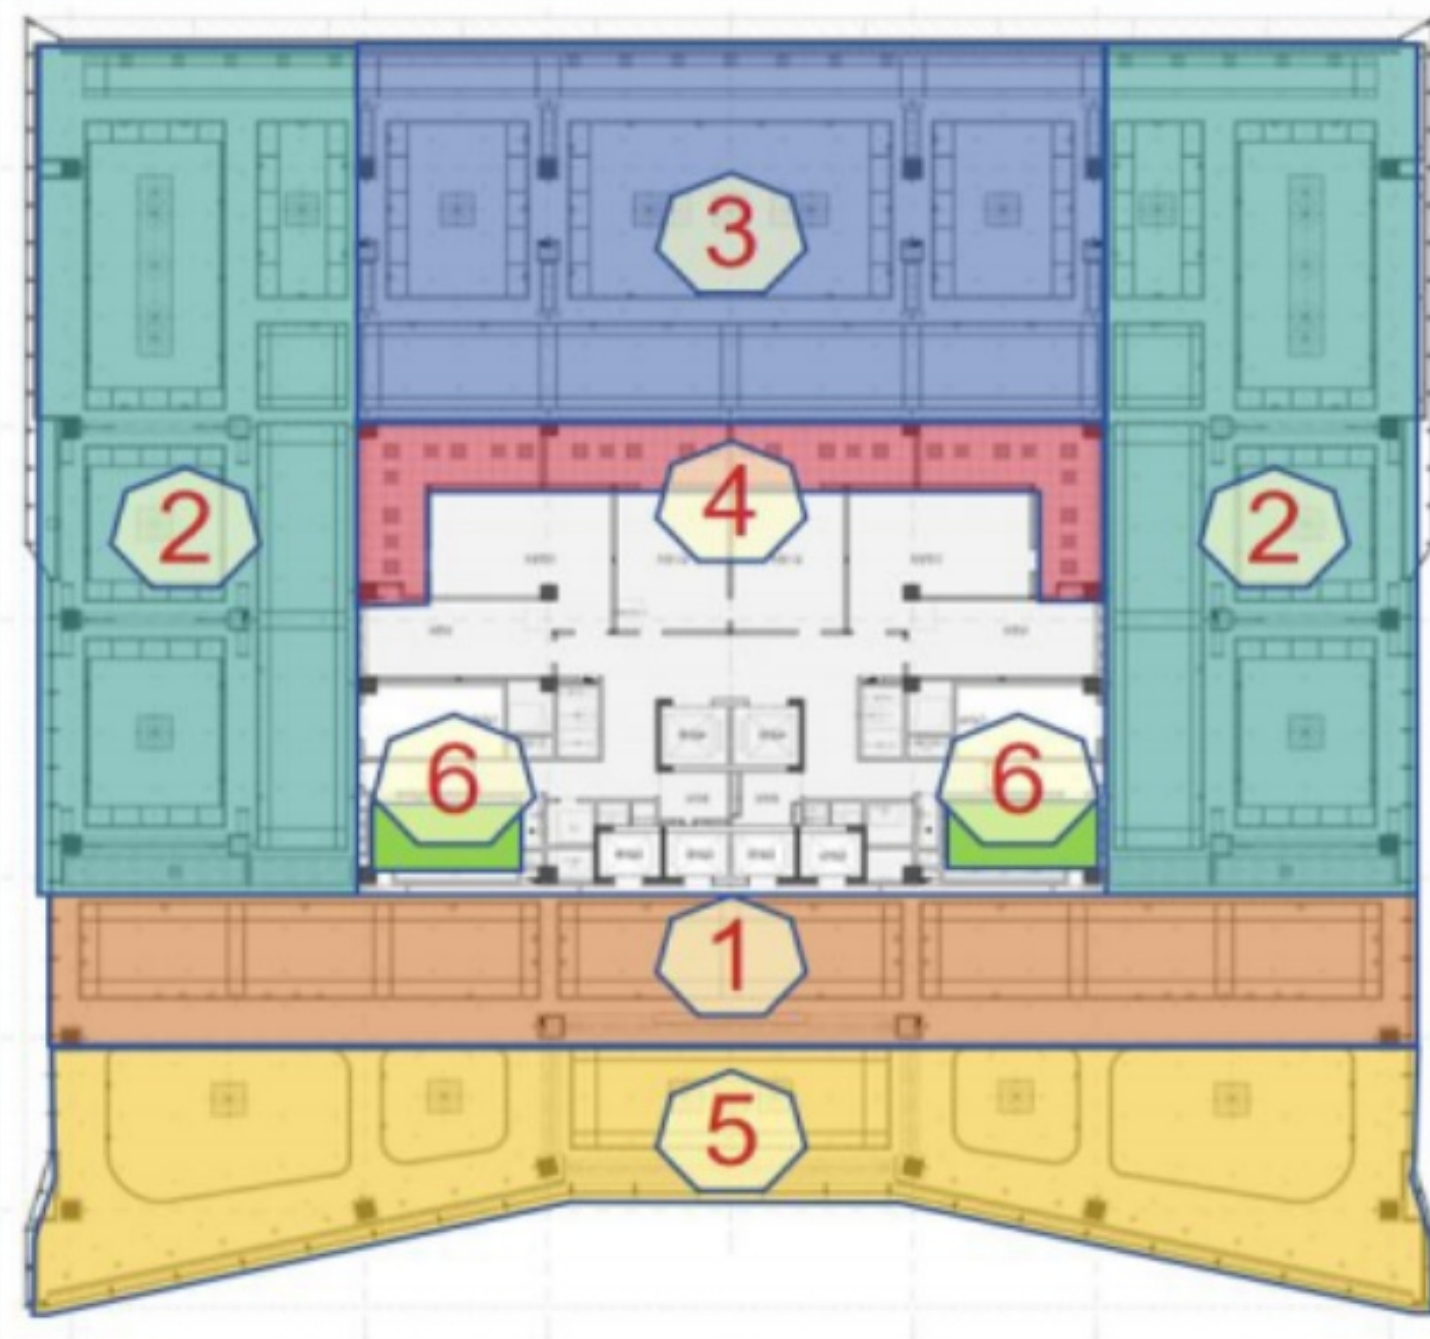


食堂二层下周计划施工段划分平面图，标注六个施工分区

2026.06.22 ~ 2026.06.28


A4

二、上周工作

2.2 高管层现场工作

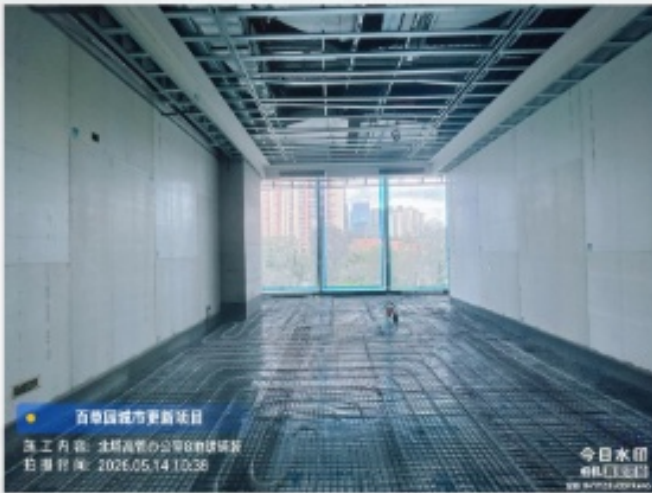

高管办公区地暖盘管及吊顶龙骨安装现场，多人协作推进隐蔽工程

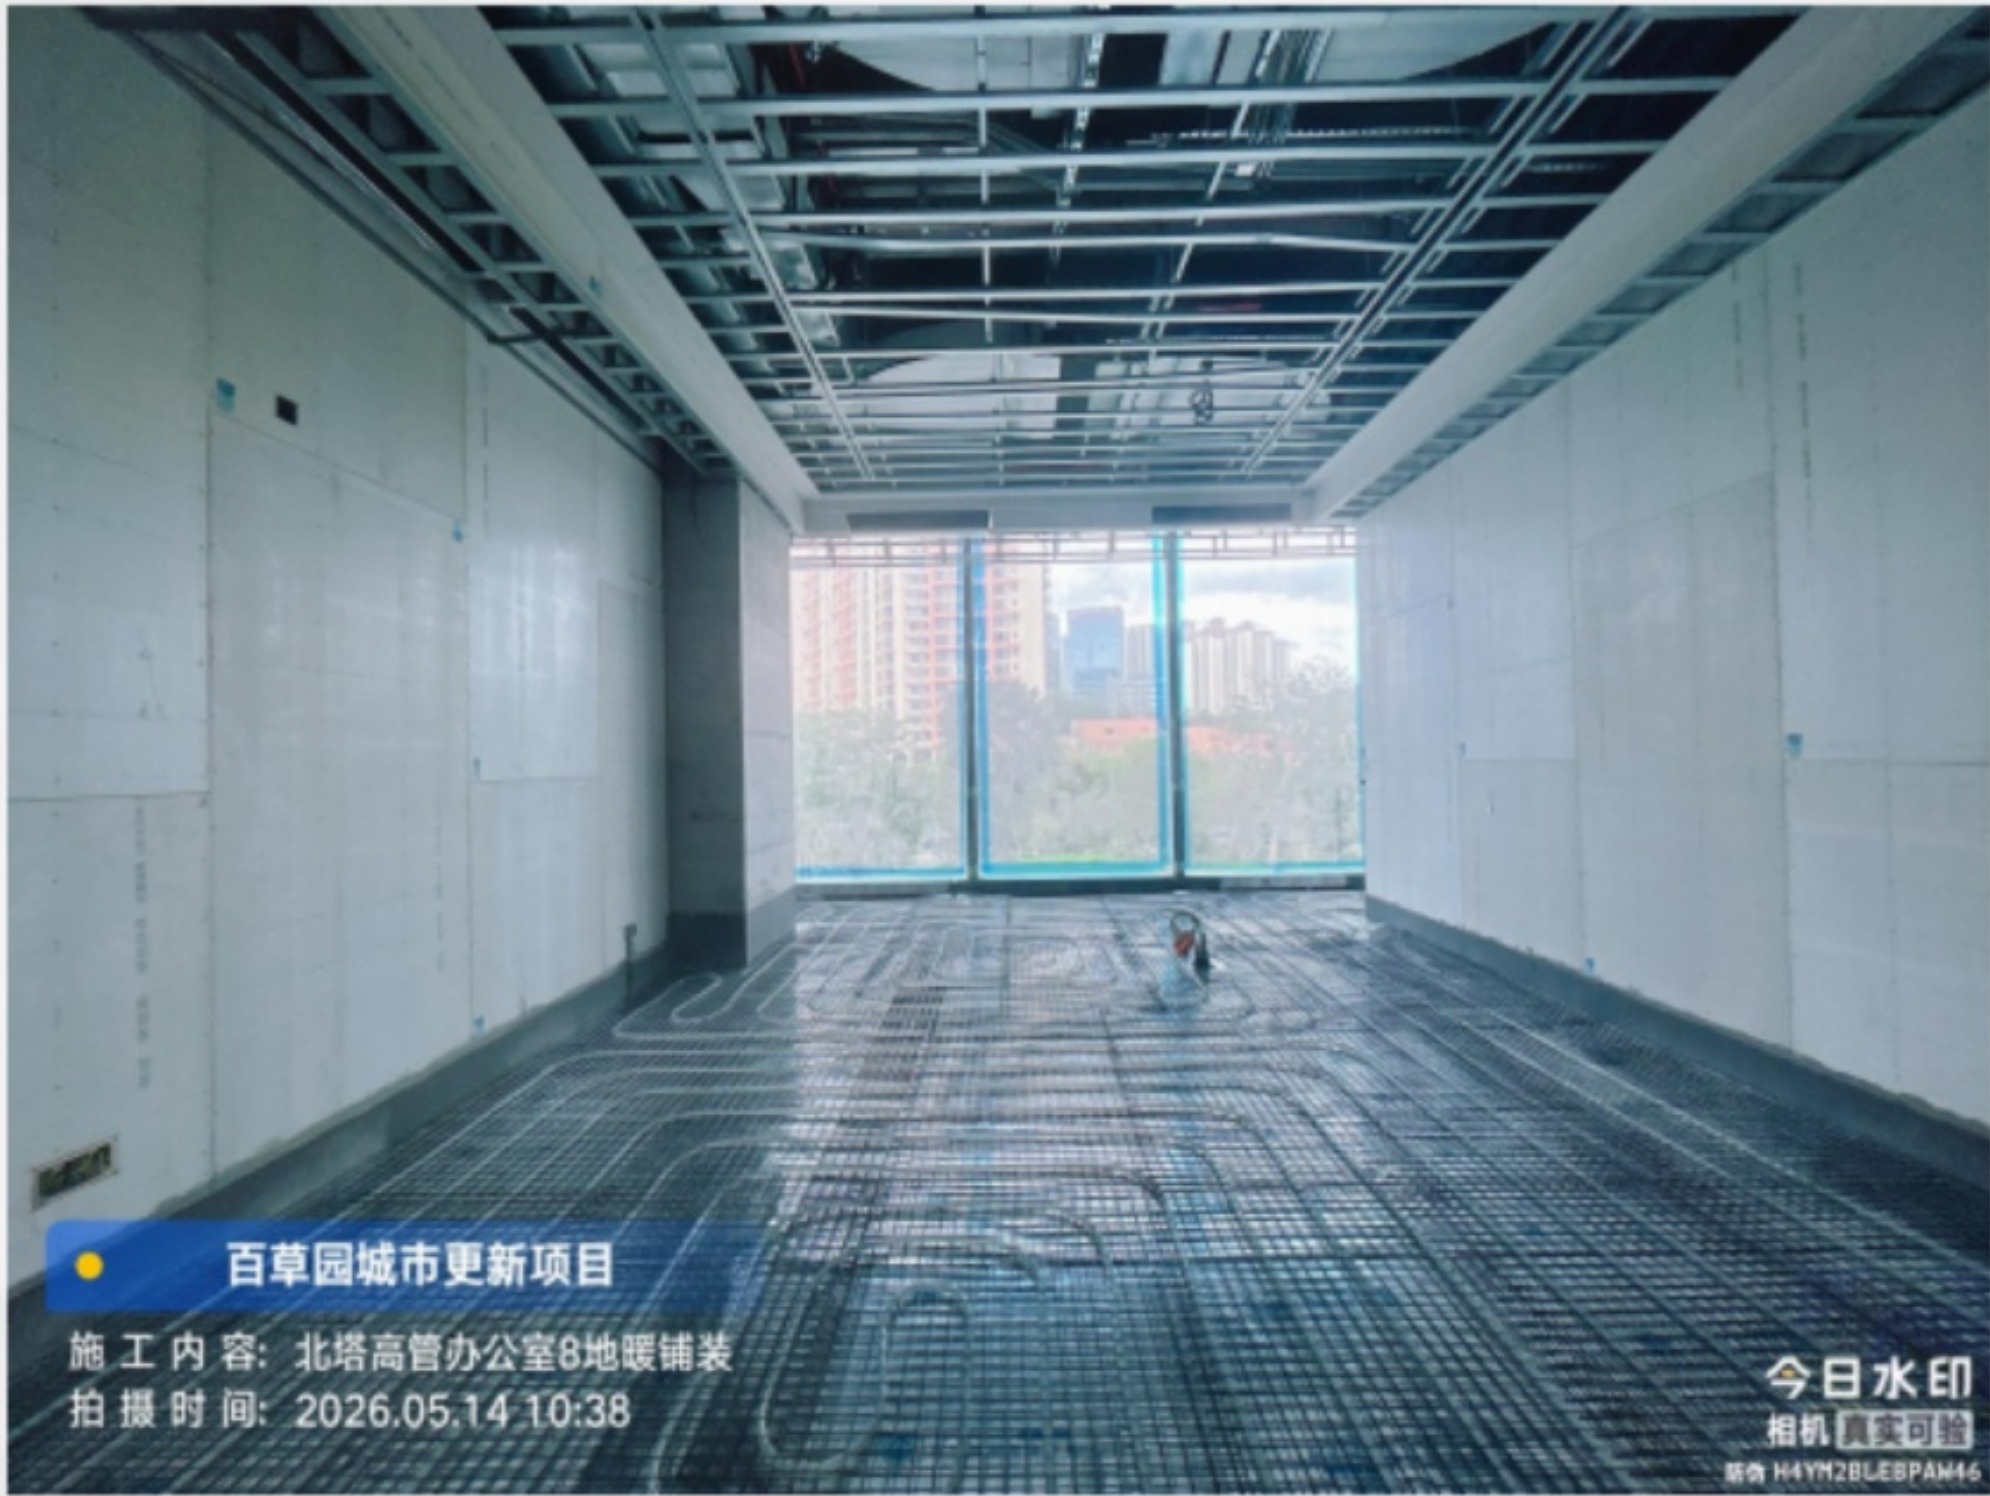

● 百草园城市更新项目

施工内容: 北塔高管办公室8地暖铺装
拍摄时间: 2026.05.14 10:38

今日水印
相机 真实可信
设备 H4YM28LE8PAM16

高管办公区8层地暖铺装施工，地面钢筋网片已铺设完成

二、上周工作

2.2 高管层现场工作



2.13 ECC销项情况

北京清尚ECC质量整改统计表

序号	问题总数	已关闭	流程关闭中	未关闭	关闭率
1	20	12	1	7	60.00%

ECC 销项照片 (0 张录入 + 1 张汇总, 共 1 张)

深圳百草园城市更新项目

切换项目

北京清尚建筑装饰工程有限公司 李欣霖

项目信息

项目计划

工程质量

工程施工

合同变更

款项申付

文档管理

苗木管理

验收移交

保修期管理

EHS

工程质量管理

自我质量管理

待处理问题

4

待处理问题 (个)

检查任务

1

24

检查任务

23

已完成

未完成

查看明细

质量问题总数

9

10

质量问题总数

101

已关闭

未关闭

查看明细

验收报告

10

24

验收报告

23

节点

综合节点

实物

查看明细

材料验收

工艺验收

节点验收

综合节点验收

变更验收

材料检查

现场巡检

导出excel

请搜索关键字

共1条

#	合同名称	合同编码	合同乙方	厂验记录	进场记录	抽检记录	
1	深圳百草园城市更新项目精装修分包工程（食堂、健身...	PPA-20251103-02	北京清尚建筑装饰工程有限公司	2	102	10	

2.13 ECC销项情况

北京清尚ECC质量整改统计表

序号	问题总数	已关闭	流程关闭中	未关闭	关闭率
1	20	12	1	7	60.00%

ECC 销项照片 (0 张录入 + 1 张汇总, 共 1 张)

深圳百草园城市更新项目

切换项目

北京清尚建筑装饰工程有限公司 李欣霖

项目信息

项目计划

工程质量

工程施工

合同变更

款项申付

文档管理

苗木管理

验收移交

保修期管理

EHS

工程质量管理

自我质量管理

待处理问题

4

待处理问题 (个)

检查任务

1

24

检查任务

23

已完成

未完成

查看明细

质量问题总数

9

10

质量问题总数

101

已关闭

未关闭

查看明细

验收报告

10

24

验收报告

23

节点

综合节点

实物

查看明细

材料验收

工艺验收

节点验收

综合节点验收

变更验收

材料检查

现场巡检

导出excel

请搜索关键字

共1条

#	合同名称	合同编码	合同乙方	厂验记录	进场记录	抽检记录	
1	深圳百草园城市更新项目精装修分包工程（食堂、健身...	PPA-20251103-02	北京清尚建筑装饰工程有限公司	2	102	10	

3.1 周工作计划

[illegible]

2026.06.22 ~ 2026.06.28

3.1 周工作计划

[illegible]

2026.06.22 ~ 2026.06.28

5.1 协调事宜

数据源：协调事宜登记（未闭环） 5 项未闭环 （共 14 项）

序号	需协调事宜	提出部门	配合部门
1	高管区暖通管线与吊顶标高冲突	精装项目部	三局机电部
2	食堂区幕墙封闭时间需确认	精装项目部	幕墙单位、总包
3	南塔咖啡厅机电移交滞后	精装项目部	三局机电部、消防单位
4	北塔样板区石材大板供应	清尚采购部	石材供应商、项目部
5	地暖施工与精装交叉作业面移交	精装项目部	地暖单位、监理

2026.06.22 ~ 2026.06.28

5.1 协调事宜

数据源：协调事宜登记（未闭环） 5 项未闭环 （共 14 项）

序号	需协调事宜	提出部门	配合部门
1	高管区暖通管线与吊顶标高冲突	精装项目部	三局机电部
2	食堂区幕墙封闭时间需确认	精装项目部	幕墙单位、总包
3	南塔咖啡厅机电移交滞后	精装项目部	三局机电部、消防单位
4	北塔样板区石材大板供应	清尚采购部	石材供应商、项目部
5	地暖施工与精装交叉作业面移交	精装项目部	地暖单位、监理
